

Groenraad Amstelveen kennisuitwisselingsmiddag 19 november 2015

# “Verbinden van werelden”

geïntegreerd werken binnen Hollandse Waterstad Gouda

# Evaluatie schema Hollandse Waterstad 2005-2009 - april 2009, versie 0.1

## Werkplan 1

- IH Inventarisatie netwerk Hollandse Watersteden juni 2005
- WG Waterrecreatie in Gouda (Mantelonderzoek) november 2005
- AG Archief en Omgevingsaan juni 2006
- HG Haalbaarheidsonderzoek waterambities Gouda juni 2006
- VF Verhalenfestival + boekje november 2006-2008
- WC Waterconferentie juni 2006-2007 en oktober 2007
- RT Ronde tafel in Gouda 2006
- WV Rondetafel voor de watersector in Gouda, 15 oktober 2006, Waterwinkel 2006
- DA Digitale archivering september 2006
- WE Website maart 2007 - november 2007
- VB Onderzoek verandering beleving Goudse bevolking 2006
- WS Watersysteemonderzoek Stadsboezem september 2007
- WB Waterbeheerplan Binnenstad plan voor de realisatie van de kunstwerken
- AB Arrangementen brochure
- IN Inventarisatie arrangementen rond thema water in de Hollandse Watersteden april 2008

## Werkplan 2

- NB Netwerk bijeenkomsten toerisme in Hollandse watersteden 2005
- IB Inventarisatie beheer kunstwerken t.b.v. recreatie juni 2005
- SB Holland Water and Samenwerkingsbijeenkomst Gouda
- PW Publiek-vriendelijke versie Watersysteemonderzoek Stadsboezem april 2007
- IT Informatiecamp met inlegvellen juni 2007
- SD Nationale Sluizendag september 2007
- BL Bestuurlijk/financieel verankerend juni 2007
- HS Historisch onderzoek sluis en bruggen september 2007
- PH Publiek-vriendelijke versie Historisch onderzoek sluis en bruggen september 2007
- IF Waterexpo Informatiepunt/verbeeldingsactiviteiten juni 2007
- BT Houtsluisen voor Loerwaai december 2007
- DO Onderdoorgang onderzoek oktober 2008
- GG Gebiedspericlic: Integrale Ontwikkeling 2007
- QW Quick Wins 2007-2008 - jeroen de garij
- KG Kennisconferentie water april 2008
- WB Waterbelevingsonderzoek juni 2008
- OS Onderzoek naar het schuren van de grachten februari 2008
- PZ Programmaverkenning Zuidelijke Toegang september 2008
- NV Bijeenkomst netwerk (2x) water in historische binnensteden april 2008
- AW Rapport aanbevelingen kennisontwikkeling in historische binnensteden september 2008


## Werkplan 3

- IO Inventarisatie knelpunten en oplossingsrichtingen onderhoud kunstwerken en watergangen oktober 2005
- AW Actieprogramma waterrecreatie Gouda en regio
- PN Promote/netwerkjeenkomsten Hollandse Waterstad september 2005 in Gouda en Huis
- NA Waterambities voor de komende jaren 2009
- IK Onderzoek beheerkosten waterkunstwerken maart 2009
- BW Beheerplan historische waterkunstwerken maart 2009
- WM Waterkwaliteitsonderzoek mei 2009
- VR Rapport Interne Vaarroute april 2009
- ZT Zuidelijke Toegang voorontwerp (MER dijkverbetering) maart 2009
- TE Rekest leren (tussen-evaluatie) april 2008
- EE Hekstus leren (eind-evaluatie) maart 2008
- OB Open maken Grachten technische vooronderzoek en kostenraming april 2008 en 2009
- BH Reekje HWS (beschrijving procesinnovatie) maart 2008
- IB Inventarisatie beheer Fijnland, opsplitsing beheertaken met Gouda juni 2008
- NK Netwerk kennisontwikkeling water en historische binnensteden april 2008
- TC kennisbijeenkomst (thema Cruises) voor Hollandse Watersteden maart 2008
- TV Themajaar vaarwegen ZH 2010: cultuurtourisme in de Hollandse waterstedenvaarwegen ZH 2010
- HO Historisch onderzoek sluis en bruggen UNESCO status
- CW Cultuurhistorie in Waterplan 2008
- ZT Voorlopig ontwerp voor alle 3 de waterambities van de gemeente Gouda, 2008-2010, aanpak van het project en in bijzonder de onderzoekende doelstellingen
- PK Inventarisatie potentiële kostendragers (rechtstreeks uit doelstellingen)
- TM Toeristisch meerjarenplan (rechtstreeks uit doelstellingen)

## Werkplan 3

## Werkplan 1


## Werkplan 2

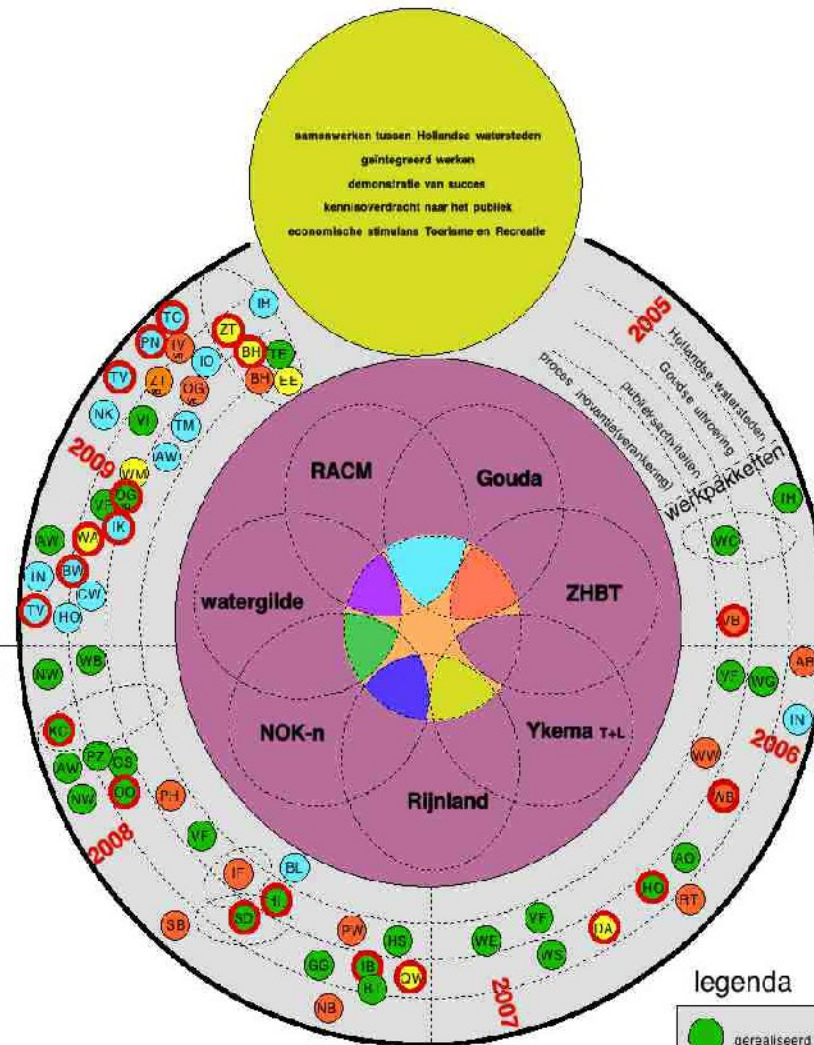

## legenda

- gerealiseerd
- niet gerealiseerd
- afronding voor einde HWS
- realisatie of afronding na einde HWS
- nieuw product niet binnen werkplan vastgesteld; en is soms aangepast

# Andere manier van werken (vooronderstellingen)



- vooraf afspraken over werkwijze
- beslissen over inhoud/proces
- werken aan producten en concrete plannen
- samenbrengen alle deelaspecten
- beeldend werken
- uitgangspunten communiceerbaar
- niet opnieuw het wiel uitvinden
- naar de mensen toe
- het veld in
- herhaling succespatronen




# Hollandse Waterstad-Gouda








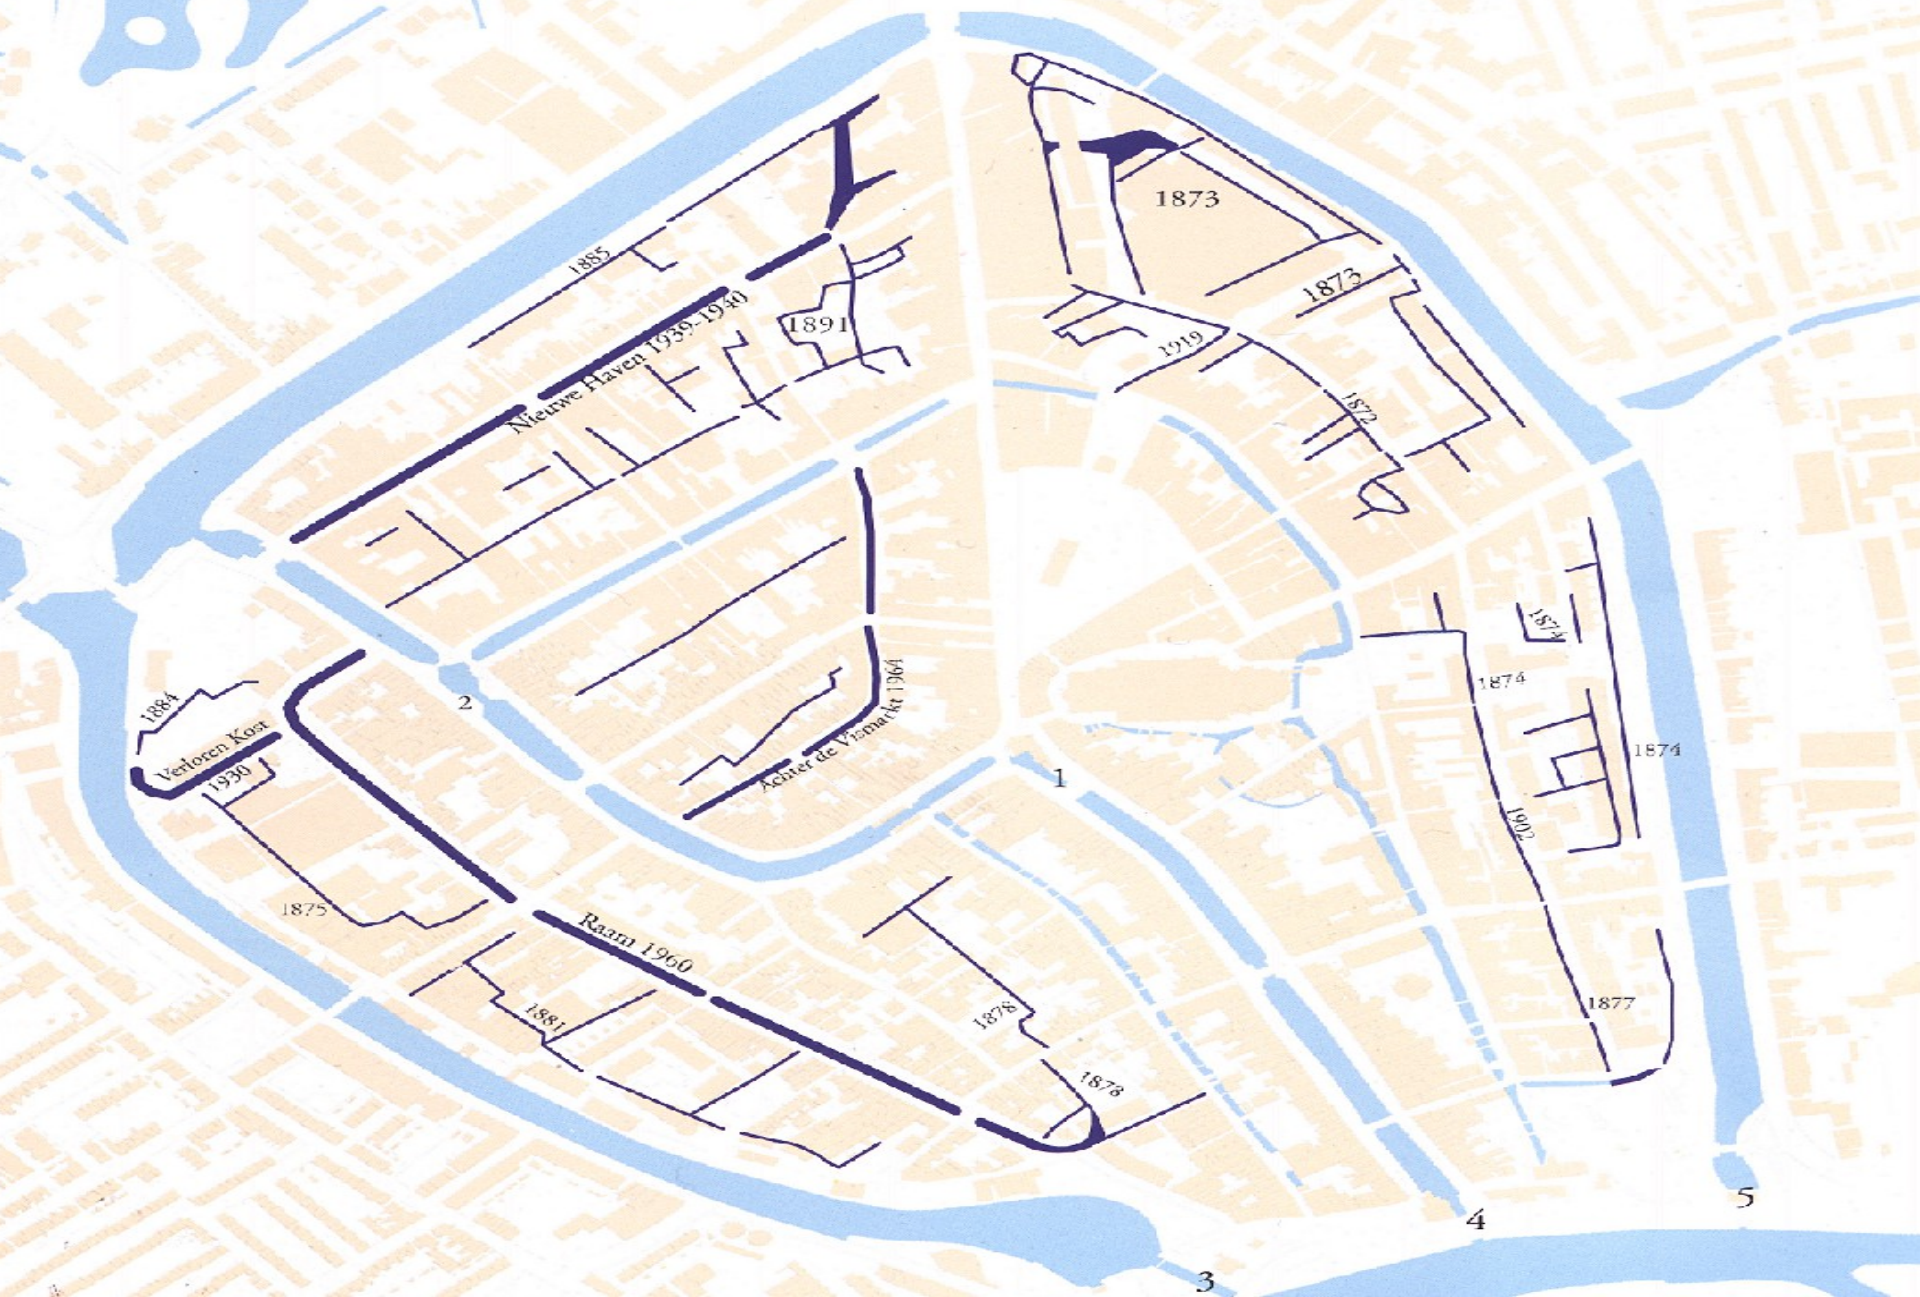


# Gedempte grachten na 1825

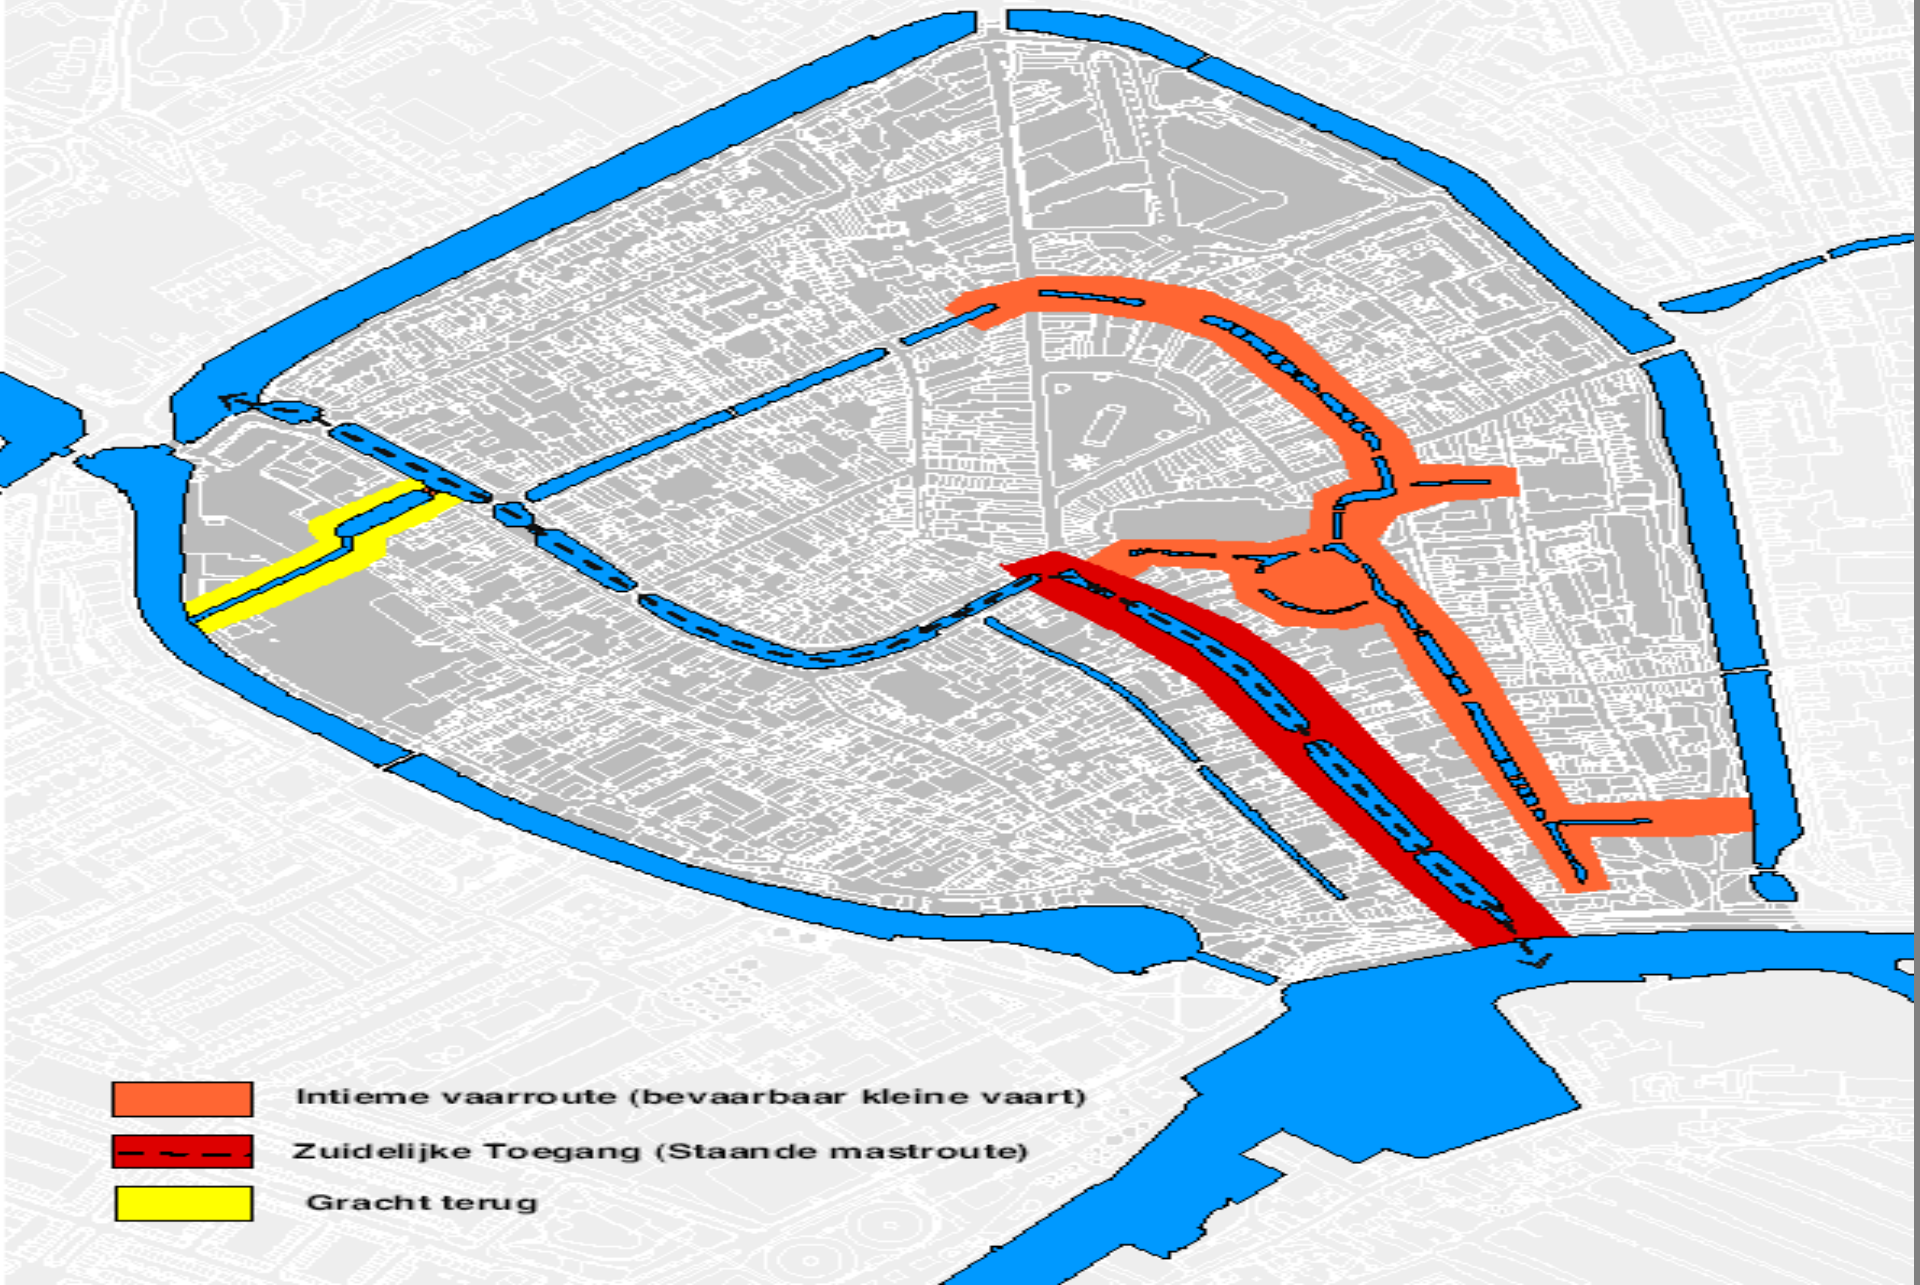

# ambities Gouda



-  Intieme vaarroute (bevaarbaar kleine vaart)
-  Zuidelijke Toegang (Staande mastroute)
-  Gracht terug



# Een Gracht terug-Verlorenkost/Nonnenwater



Huidige situatie



Situatie ca. 1950

# Openmaken Zuidelijke Toegang-staande mastroute



Huidige situatie



Situatie ca. 1900

# Intieme vaarroute



Huidige situatie




Situatie ca. 1900

# Hollandse Waterstad Gouda- doelen



- Samenwerking tussen Hollandse watersteden
- **Geïntegreerd werken**
- Demonstratie van succes
- Kennisoverdracht naar het publiek
- Economische stimulans voor Toerisme en Recreatie

# Haalbaarheidsonderzoek in een snelkookpan

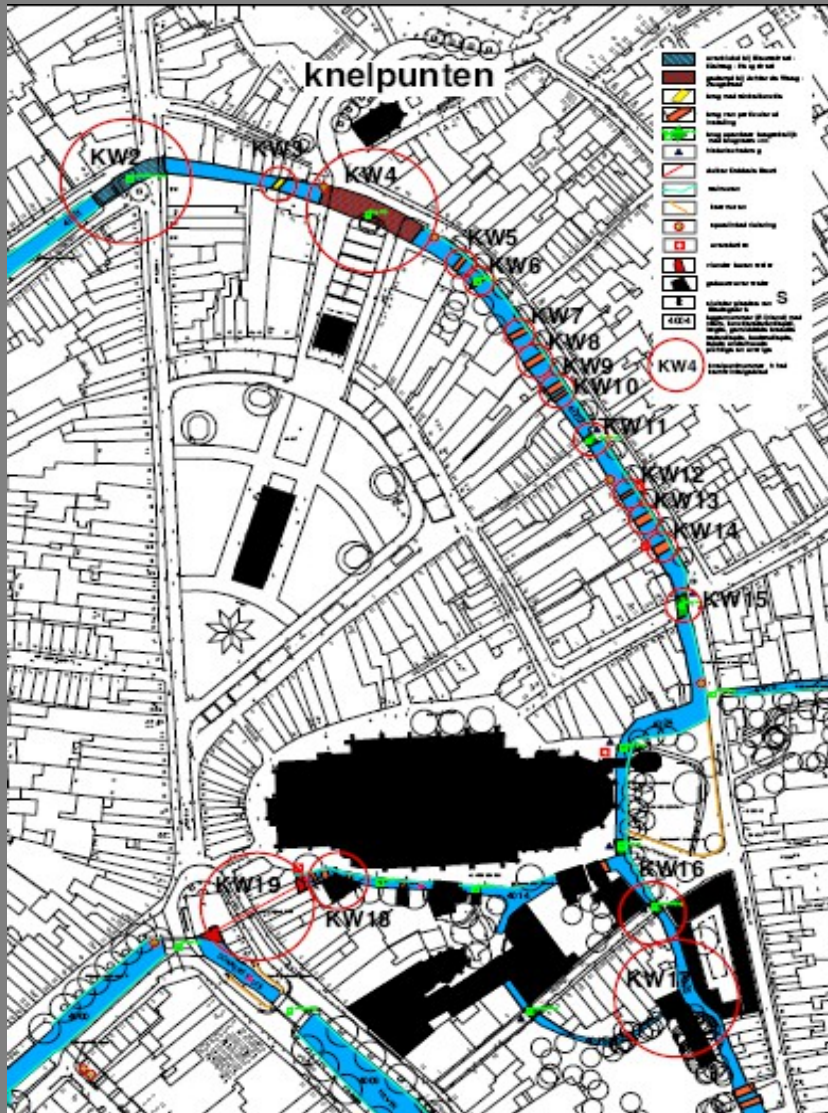

- Selectie ingenieursburo
- Leesmap samenstellen
- Multidisciplinair
- Fysiek langs kneelpunten
- Uitgangspunten formuleren
- Principes vastleggen
- Presentatie aan besturen

## **Wat hebben we geleerd van geïntegreerd werken?**

Water wordt door de consortiumpartners en daarbuiten gezien als een drager van identiteit en biedt kansen voor stadsontwikkeling (cultureel en Havenkwartier), economie, leefbaarheid en Toerisme, bewustwording over een samenhangend systeem

Bewustzijn en begrip ontwikkeld over mogelijkheden en onmogelijkheden bij de consortiumpartners onderling (beeld, kennis en werkvelden)

integratie van kennis plaatsgevonden, vergroten van mogelijkheden

veel meer plezier in het samenwerken (enthousiast geworden)

vanuit Rijnland meer aandacht voor cultuurhistorie (watersysteemmodel is daar aan opmaat voor geworden, discussie met historische clubs voor herstel en gebruik van het historische watersysteem)

kennisleemtes hebben we in beeld gebracht (watersysteemmodel van Rijnland, toeristische onderzoeken en haalbaarheidsstudie)

## **Wat is anders dan verwacht?**

samenwerken pas na 2 jaar intensief werken, soms ook strijd heeft vruchten afgeworpen

discontinuïteit door wisseling van deelnemers/projectleiders, steeds de boodschap opnieuw vertellen, effect is veel tijd nodig om de boodschap naar 'buiten' (buiten het consortium) te vertellen, project dijt uit en kern wordt diffuus

agenda's van de verschillende partijen niet of onvoldoende bij aanvang van het project op tafel zijn gekomen, mensen en partijen moeten aan elkaar wennen m.a.w. hoe groot is belang en daardoor de bereidheid om energie in het project te steken

legitimatie moet bevochten worden vanuit de verschillende organisaties om deel te nemen aan het project (reorganisaties, menswisselingen)

hoe concreter hoe meer de belangen ogenschijnlijk tegenover komen te staan (abstracte thema's zijn nog nader invulbaar, bij concrete producten is er iets te meten en weten)

Verrassingen

## **Wat zijn de concrete fysieke resultaten?**

## **Wat betekent dit voor mijn werk?**
